



BAIGNOIRE SABOT PATRIOTE

Requis pour l'installation

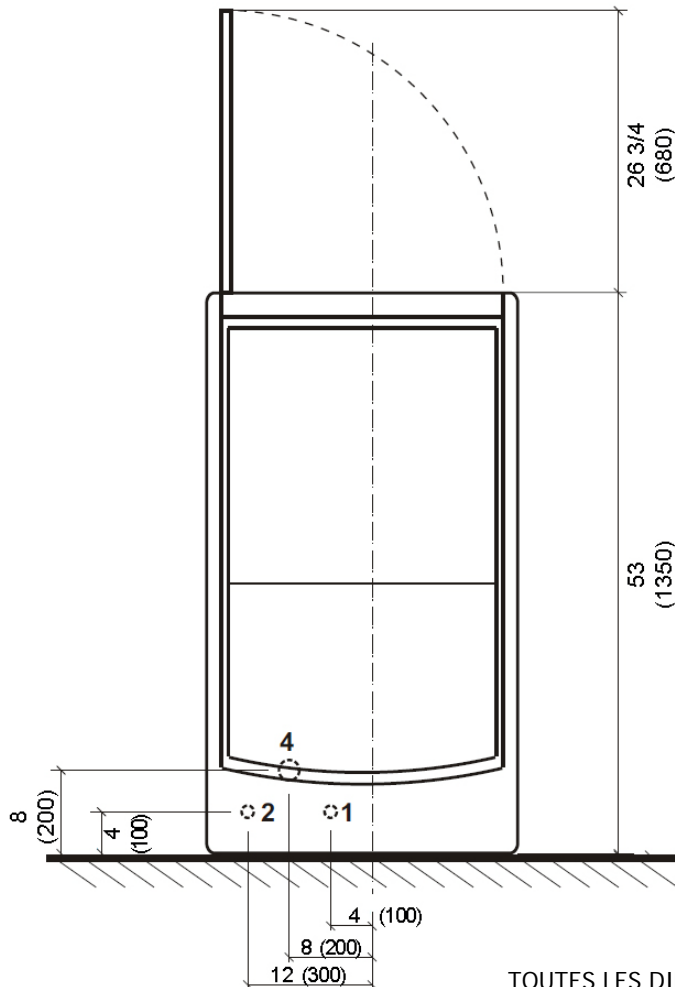

1. Sortie eau chaude fileté 3/4 po
2. Sortie eau froide fileté 3/4 po
3. Prise électrique 120V 15A GFI
4. Drain de 2 po au plancher

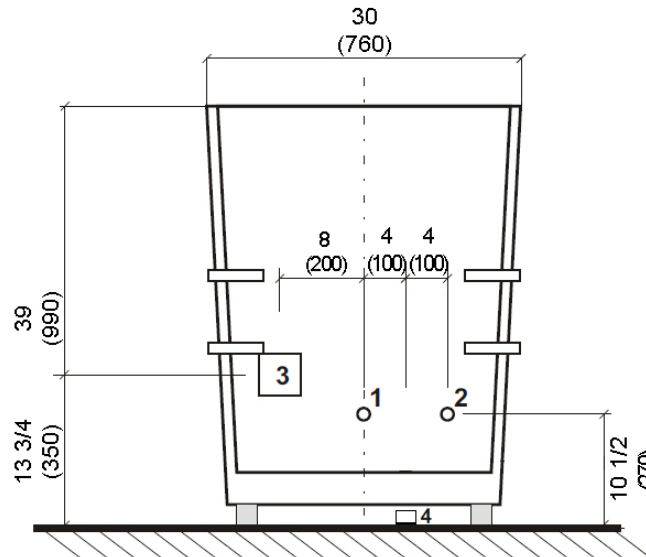

TOUTES LES DIMENSIONS SONT INDIQUÉES EN POUCES (MM)

PLOMBERIE

Les sorties d'eau chaude et d'eau froide doivent être munies chacune d'une valve (robinet) et un raccord 3/4 pouce filetés; Un drain au plancher de 2 pouces doit être installé. L'eau chaude doit être disponible au moment de l'installation.

ÉLECTRICITÉ

Une prise électrique trois fiches 120 volts, 15 ampères de type disjoncteur de fuite à la terre (Ground Fault Interrupter (GFI)) doit être installée à une hauteur d'environ 14 pouces.

INSTALLATION

Le bain Patriote est une structure autoportante ne nécessitant aucun ancrage. Tous les travaux de plomberie, de plancher, de peinture et d'électricité doivent être terminés avant l'installation du bain.

BAIGNOIRE SABOT PATRIOTE

Requis pour l'installation

Cette feuille doit être complétée et retournée avant l'installation du bain

SVP lire attentivement toutes les sections avant de crocheter les cases



Plomberie

Les sorties d'eau, chaude et froide sont installées. Chacune des sorties est munie d'un raccord 3/4 pouce et d'une valve (robinet)

Le drain au plancher* de 2 pouces est installé _____

**Si le bâtiment comprenait déjà un drain mural, veuillez spécifier l'emplacement du drain en hauteur à partir du sol (_____ pouce(s)) et la distance horizontale par rapport à la prise électrique (_____ pouce(s)).*

Électricité

Une prise électrique trois fiches 120 volts, 15 ampères de type disjoncteur de fuite à la terre (Ground Fault Interrupter (GFI)) est installée et localisée à une hauteur d'environ _____ pouces du sol (*Dans le cas contraire, spécifiez: _____ pouces*)

État Du Plancher

Le plancher est terminé et est libéré de toutes obstructions aux alentours de l'emplacement prévu pour le bain _____

Le plancher est fait de ciment (*Si autre, spécifiez: _____*) _____

Le plancher est-il muni d'un dispositif chauffant** (plancher chauffant) ? _____ OUI NON

***Si oui, contacter ConfortMédic.*

État Des Murs

La plomberie et l'électricité dans les murs sont terminées, les murs sont peints*** et il n'y a aucune obstruction du niveau du sol jusqu'à une hauteur de 70 pouces _____

****Les plinthes peuvent être laissées en place. Si le mur est fait de carrelage, celui-ci doit être terminé avant l'installation.*

Accessibilité

Le bain n'est pas installé dans une salle où il est nécessaire de passer par une cage d'escalier et où les accès sont difficiles _____
ou

Le bain doit être installé dans une salle où il est nécessaire de passer par une cage d'escalier et où les accès sont difficiles, toutefois les arrangements nécessaires seront pris avant l'installation pour assister le technicien de ConfortMédic _____

Les corridors devant être empruntés sont tous d'une longueur minimale de 8 pieds (*Dans le cas contraire, spécifier: _____ pieds*) _____

Les portes devant être franchies sont toutes d'une largeur minimale intérieure de 36 pouces (*Dans le cas contraire, spécifier: _____ pouces*) _____

Le bâtiment comprend un quai de déchargement**** _____ OUI NON

***** Si oui, spécifier la hauteur du quai: _____ pieds*

IMPORTANT (Ces deux dernières cases doivent être crochétées pour que ConfortMédic permette l'installation)

Nous confirmons que les sorties d'eau, le drain, l'électricité ainsi que l'eau chaude seront conformes et opérationnels au moment de l'installation.

Nous comprenons que des frais supplémentaires s'ajouteront dans le cas où le technicien doit attendre parce que les requis mentionnés ci-haut n'ont pas été complétés. Nous assumerons aussi la totalité des frais reliés à toutes autres visites nécessaires dues à l'inexactitude des informations fournies.

Nom en lettre moulé: _____

Date: _____

Signature: _____

Bon de commande: _____

Adresse du site: _____

Nom de la résidence: _____
